

福祉生活病院常任委員会資料

(平成29年1月19日)

【件名】

- 1 中央病院建替整備工事の進捗状況等について（病院局総務課）…………… 1

病 院 局

中央病院建替整備工事の進捗状況等について


平成29年1月19日
病院局総務課

平成29年1月現在の中央病院建替整備工事の進捗状況について報告します。

記

1 進捗状況

- 杭工事の施工中であり、概ね4割程度の杭を打設済
- 3月中には杭工事を終え、基礎工事に移行予定

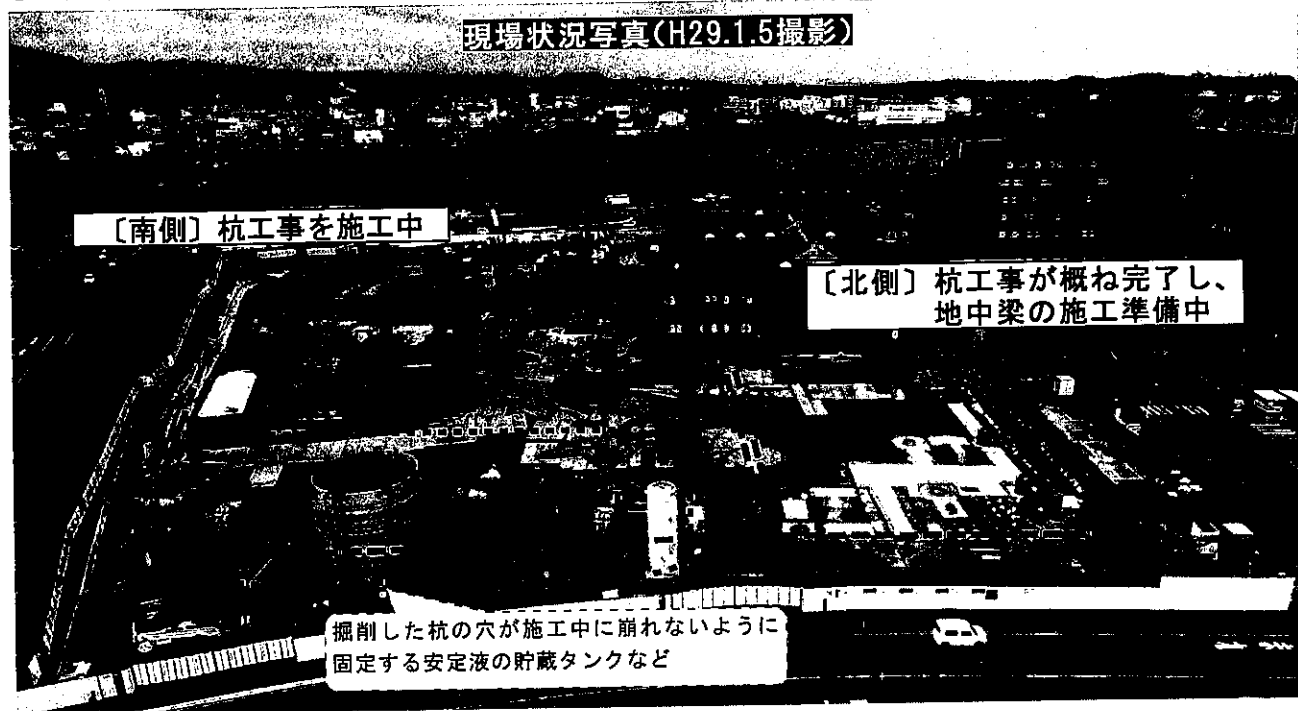

2 全体の進捗予定

区 分		H28	H29	H30	計
工事進捗	出来高割合	7.4%	73.1%	19.5%	100.0%
	主な内容	・材料調達 ・杭打ち ・基礎工事	・H29.7頃、免震層完成 ・以降立上げ(躯体完成)	・内装仕上げ ・設備工事仕上げ	・H30.7完成後、引越 ・H30.10オープン
継続費(新病院建設)		18.0億円	191.4億円	57.2億円	266.6億円

3 スケジュール(予定)

(1) 当面

時期	H28			H29				
	11月	12月	3月	4月	5月	6月	7月	12月
内容	杭工事		基礎工事	免震層設置工事(1階)		鉄骨工事(1階から順次立上げ)		

(2) 全体

区 分	H28	H29	H30	H31	H32
新病院建設工事 (本館新築)	8~9月		7月 10月 8月 9月 オープン		
(外来棟先行改修)					
外来棟改修(本格改修)			10月	6月	
本館解体・駐車場整備				8月	3月
