

福祉生活病院常任委員会資料

(平成29年4月21日)

【件名】

- 1 中央病院建替整備工事の進捗状況等について（病院局総務課）…………… 1

病 院 局



中央病院建替整備工事の進捗状況等について


平成29年4月21日
病院局総務課

平成29年4月現在の中央病院建替整備工事の進捗状況について報告します。

記

1 進捗状況

- 現在、杭工事及び基礎工事を施工中であり、杭工事は4月下旬、基礎工事は7月中旬完了予定
 - 6月下旬には免震層設置工事に着手予定
- 【強固な地盤による杭工事の難航並びに1月及び2月の大雪による現場作業の一時中断により、約1.5か月遅れて進捗している。】

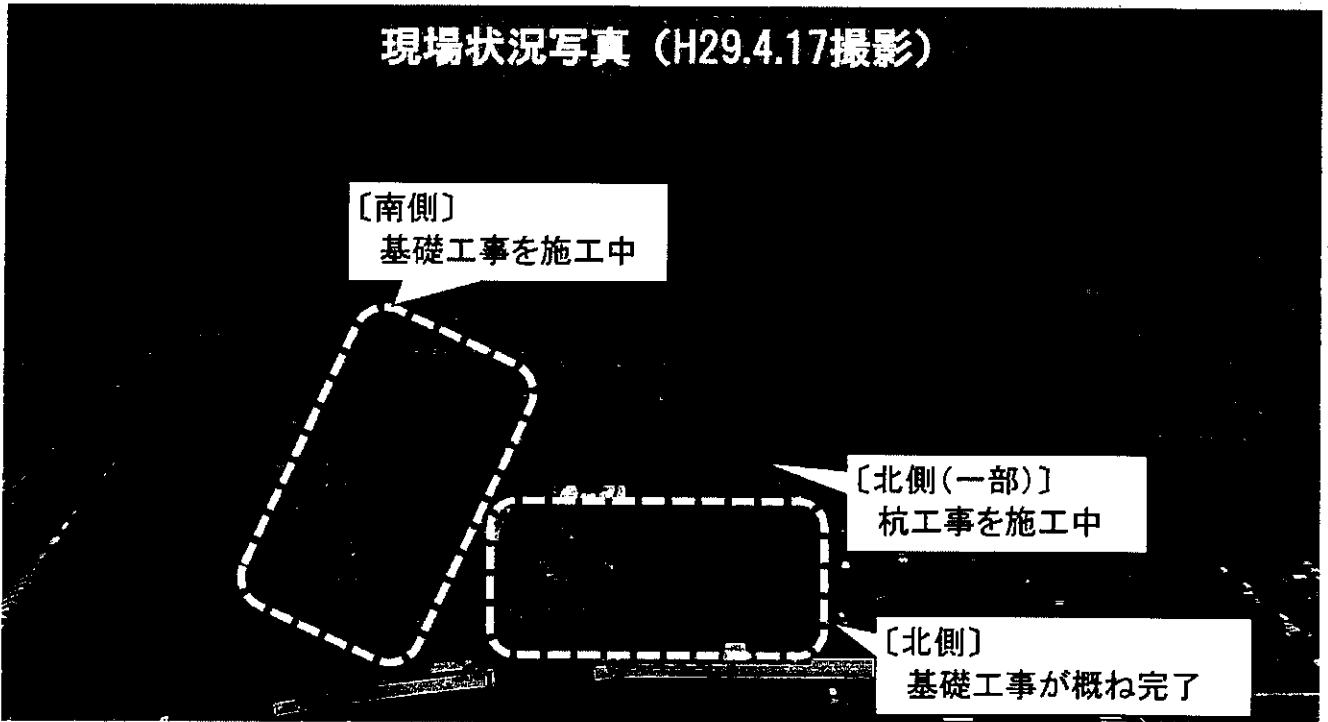

2 全体の進捗予定

区分		H28	H29	H30	計
工事進捗	出来高割合	7.4%	73.1%	19.5%	100.0%
	主な内容	・材料調達 ・杭打ち ・基礎工事	・H29.8頃、免震層完成 ・以降立上げ(躯体完成)	・内装仕上げ ・設備工事仕上げ	・H30.9完成後、引越 ・H30.12オープン
継続費(新病院建設)		18.0億円	191.4億円	57.2億円	266.6億円

3 スケジュール(予定)

(1) 当面

時期	H28			H29				
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
内容	← 基礎工事			→ 杭工事				
	← 免震層設置工事(1階)			→				
	← 鉄骨工事(1階から順次立上げ)			→				

(2) 全体

区分	H28	H29	H30	H31	H32
新病院建設工事 (本館新築)	8~9月		9月 12月 10月 12月		
(外来棟先行改修)					
外来棟改修(本格改修)				12月 7月	
本館解体・駐車場整備				8月	3月

