

# 海岸保全事業の進捗状況について

## 海岸保全事業の進捗状況について(平成30年11月)

主要な工種	単位	全体	完了	残	備考
沖合施設	基	23(5)	23(2)	0(3)	富益工区は暫定形であり、改良が必要。両サイド(1号)については、モニタリング等の状況に応じ、実施する。
施設改良	基	5	2	3	現在3基目を改良中、引き続き4基目の改良に着手予定
突堤	基	42	42	0	
護岸	m	2,322	2,322	0	
緩傾斜護岸	m	720	720	0	
サンドリサイクル	式	1	1	1	




### ■本年度工事について

- ①富益工区 人工リーフ改良3基目(40m/180m) (R1.9完成)
- ②富益工区 人工リーフ改良3基目(180m/180m) (R2.9完成予定)
- ③富益外養浜工事(R2.3迄)
  - 1. 日野川河口 → 富益工区 2,000m<sup>3</sup>(R1.4)
  - 2. 日野川河口 → 皆生工区 2,000m<sup>3</sup>(R1.6)
  - 3. 日野川河口 → 皆生工区 3,000m<sup>3</sup>(R1.10)
  - 4. 境港工区 → 富益工区 25,000m<sup>3</sup>(R1.11~R2.3)

## 6. 富益工区の今後の整備方針(案)

### (2) 人工リーフ改良整備順序

- ・境港側から2基目の人工リーフから改良に着手
- ・平成30年度までに2基の改良が完了し、現在は3基目を改良中
- ・次年度より4基目の改良を予定している
- ・引き続き、境港工区の堆積土砂を人工リーフ改良箇所背面へ投入
- ・日野川河口の土砂についても投入(粗い粒径)

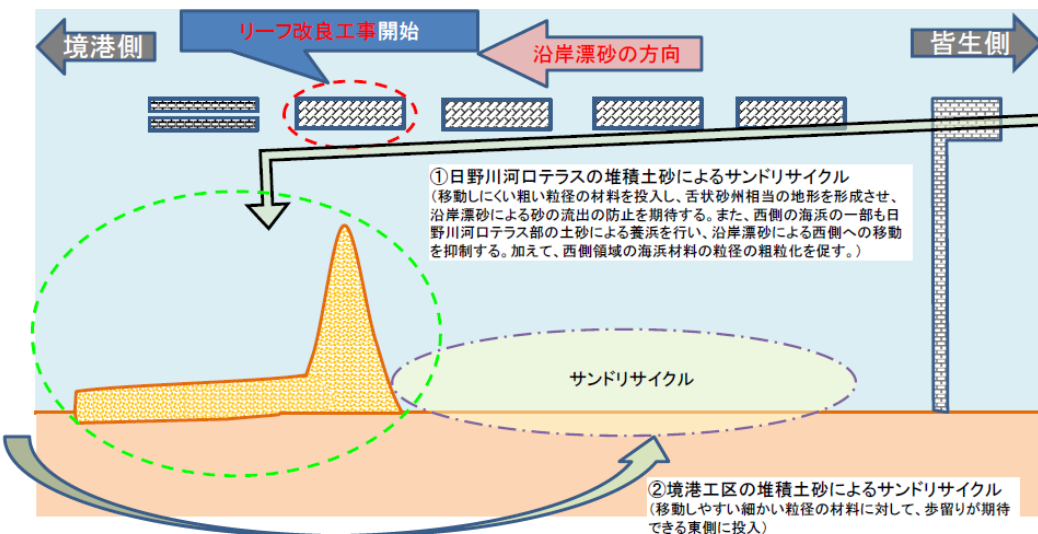

富益工区 養浜予定箇所  
※R1.10台風19号直後の状況



富益工区 養浜予定箇所  
※施工イメージ

