

浦富東工区



浦富IC周辺では、浦富高架橋の床版コンクリートの施工が進み、橋が繋がるとともにインターチェンジの完成形が見えてきました。

今後は、浦富高架橋の表面(橋面防水や橋面舗装など)の工事が始まります！

また、早期開通に向けて、浦富ICのオンランプやオフランプ及びその周辺の改良工事も同時並行で進めていく予定です。

東浜工区



東浜工区では、残っていた大規模な山切工事が完了し、岩美道路全体の形が現れてきました！引き続き、山切でできた長大斜面を保護するための法面工事が本格的に始まります。

また、並行して東浜工区全体で残りの盛土工事なども行います。さらに、東浜IC付近では、開通済みの東浜居組道路区間と接続させる工事が本格化します！

日野谷工区



日野谷工区では、日野谷川を跨ぐアーチカルバート周辺の擁壁工事や盛土工事が順調に進んでおり、東浜トンネルから鳥取方面に向けて岩美道路の形が少しずつ見えてきました。

引き続き、完成高さまで盛土工事や水路工事などを進めていく予定です。



東浜トンネル



東浜トンネル内では、コンクリート舗装工事が完成しました！今後は、開通に向けてトンネル照明などのトンネル内の電気設備系の工事を本格的に進めていきます。

【岩美道路/フェイスブック/インスタグラム】

岩美道路では、日々の整備状況や土木の魅力幅広くPRするため、ホームページのほかに、公式SNS(インスタグラムやフェイスブック)を開設しています。公式SNSでは、岩美道路の日々の工事状況や現場での出来事など幅広い情報を投稿しています。こちらも、ぜひご覧ください！





浜坂道路Ⅱ期事業の
取組み状況をお知らせします。

令和4年3月24日(木) 発行
【お問合せ】兵庫県但馬県民局新温泉土木事務所
浜坂道路第1課・第2課・設備課 TEL:0796(82)5695
用地課 TEL:0796(82)5683

各地区の工事進捗状況についてお知らせいたします。橋梁等を各工区で工事中です。引き続きご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

釜屋地区



釜屋地区では、橋台工事を行っており、橋台4基中3基(①)が令和4年3月末に完了します。引き続き、残り1基の橋台工事(②)と擁壁部の工事(③)の施工を進めていきます。

①、②の工事完了後は引き続き橋桁を架ける工事を行う予定です。



栢谷地区

栢谷地区では、高架橋の橋脚4基(①)が完成しました。新温泉浜坂ICで降りるときには、迫力ある橋脚の姿を見ることができます。これからは、農道が浜坂道路の下をくぐるようにするためのBOXカルバートの施工や鳥取側へ延伸するための切土工事に着手します。

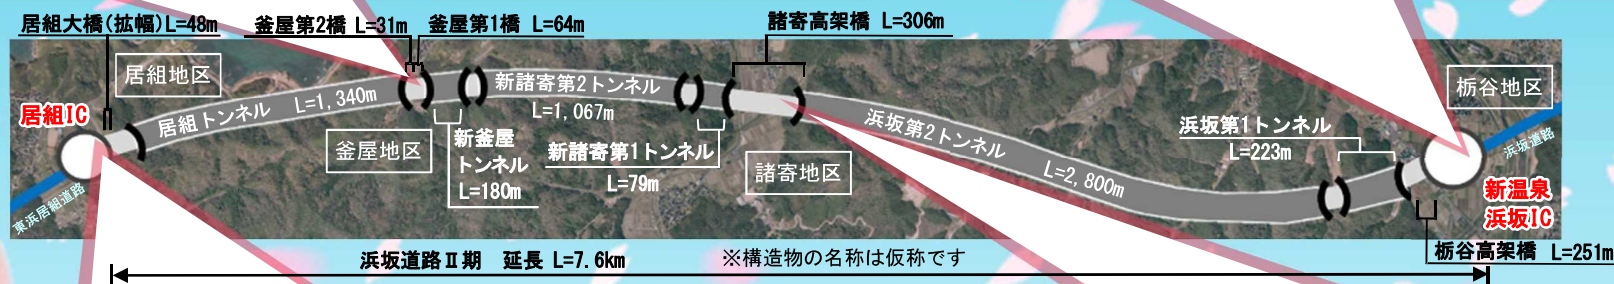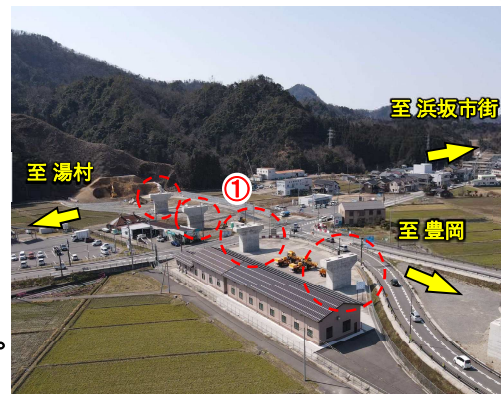

【浜坂道路フェイスブック】
浜坂道路Ⅱ期の進捗状況や新温泉土木事務所のトピックス等を掲載していますので、ぜひご覧ください。
<https://www.facebook.com/shinonsen>

居組地区

居組地区では、居組ICに入って左手側に居組トンネルを建設予定であり、その前準備として全12段の切土を計画しています。令和2年11月から現場着手し、令和3年末で上から6段目まで完成しました。現在はさらに2段を切土するよう工事しています。



諸寄地区

昨年から工事をしてきた4基の諸寄高架橋橋脚のうち1基(①)が完成しました。残る3基の橋脚(②)は今年の夏までに完成予定です。釜屋側の山切り工事(③)も順調に進んでいます。また、春からは浜坂側へ繋がるトンネル工事のために、鋼材を組立てて工事用スロープの設置を行う予定です。

