

中海圏域調査特別委員会資料

(平成23年12月15日)

項目	ページ
1 国営中海土地改良事業（干拓地代替水源施設）の整備 状況について	【農地・水保全課】 1
2 境港市渡地区の護岸整備の進捗状況等について	【河川課】 2


農 林 水 産 部
県 土 整 備 部

国営中海土地改良事業（干拓地代替水源施設）の整備状況について

平成23年12月15日
農地・水保全課


中海淡水化中止に伴う干拓地の代替水源の整備状況について次のとおり報告します。
 なお、鳥取県側は、平成23年度に工事完了する予定であったが、完了に向けた工事や施設管理にかかる地元協議の調整により、平成24年度も引き続き工事を行う予定です。
 （島根県側を含む事業全体は平成25年度完了予定）

1 整備状況（平成23年12月現在） （彦名工区）

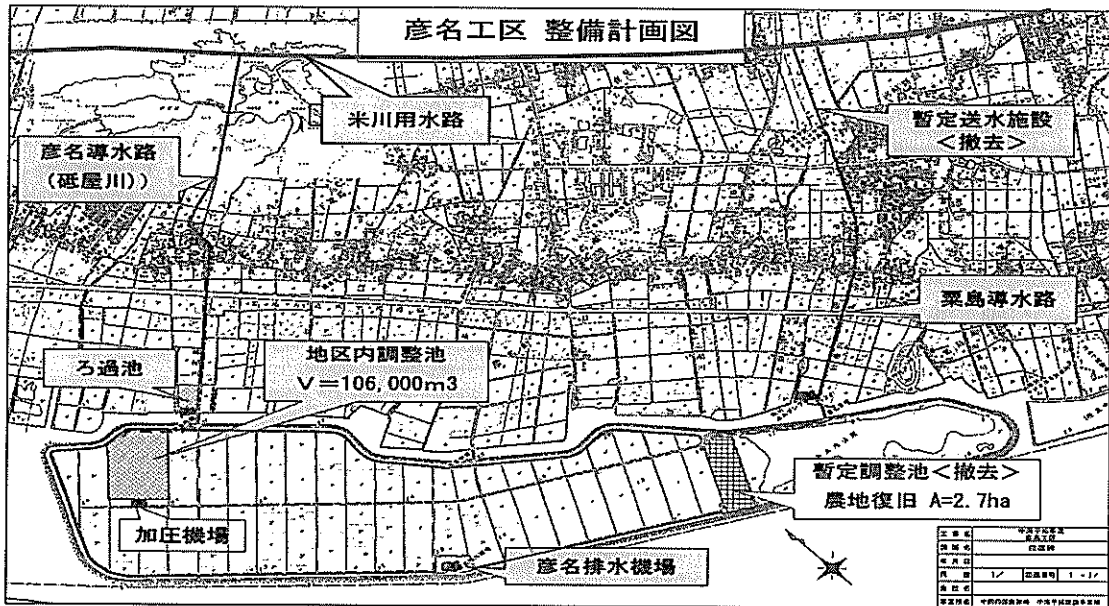

- 米川からの送水施設（導水路、ろ過池）及び干拓地施設（調整池、加圧機場、排水機場）は完了。
- 平成22年春から代替水源施設で試験送水中。
- 暫定調整池の撤去は完了し、現在農地（2.7ha）に復旧する工事を施工中。

（弓浜工区）

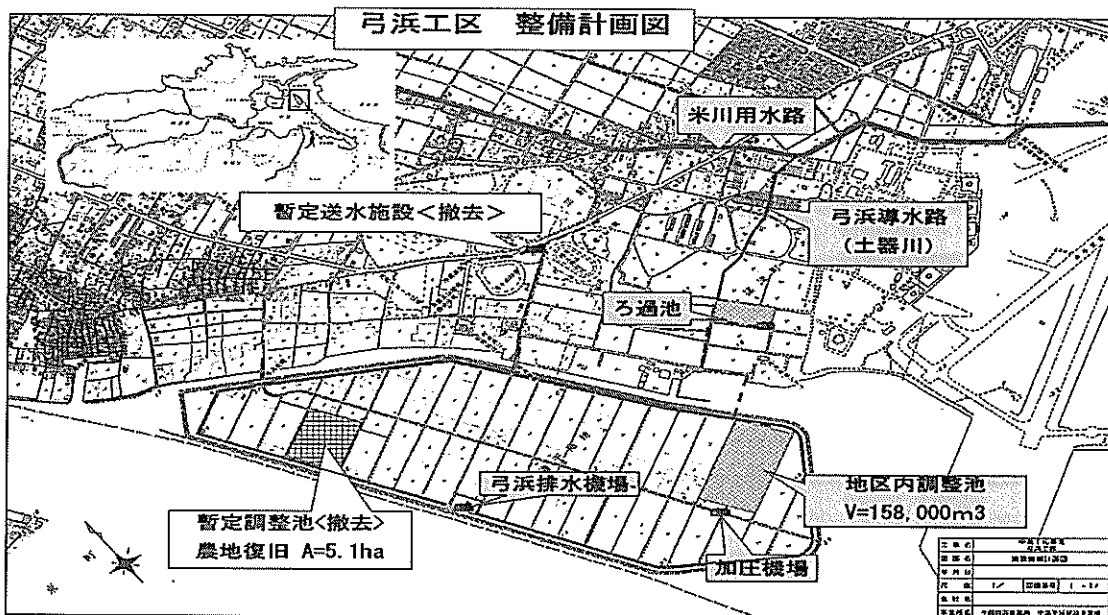

- 米川からの送水施設（導水路、ろ過池）及び干拓地施設（調整池、加圧機場、排水機場）は完了。
- 現在、新旧調整池の送水切替工事を実施中。（H23完了）
- 平成24年春から代替水源施設で試験送水を行う。
- 暫定調整池の撤去と跡地の農地（5.1ha）復旧及び、暫定送水施設の撤去は平成24年度から工事着手の予定。

2 今後の予定

- 平成24年春から、米川及び新たな施設を使って計画に沿った両工区への送水を開始し、施設の不具合等の検証を行う。
- 平成23年度内を目処に、維持管理にかかる地元の合意を図り、平成24年度に管理方法などを定めた管理計画を作成する。
