


今後の市場整備スケジュール

整備スケジュールの変更について

実施設計を進める中で、新たな課題が発生。整備スケジュールを見直し

- 1号・2号上屋の工期延長
〔当初〕18ヶ月～20ヶ月
→ 護岸補強のための自立矢板設置工事の追加

⇒ 工期が31ヶ月へ。




- 平成32年度までの主要施設の完成及び平成35年度事業完了が困難に

⇒1号上屋を分割して施工する方針を、一括施工へ変更。
1号及び陸送上屋を平成32年度完成へ


市場整備想定スケジュール(平成28年7月時点)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
		Step 1	Step 2	Step 3	Step 4		
①港湾岸壁仮設工事		●8月～運用開始					
②5・6・7号増深工事		浚渫工事					
③2号岸壁耐震化工事							
④トラックスケール新築工事		9ヶ月	前倒し・工期延期 ●1月～トラックスケール切り替え				
⑤3号上屋(南)改築工事		9ヶ月	前倒し				
⑥5号上屋改修工事			9ヶ月				
⑦1号上屋新築工事(1工区)			1工区(18ヶ月)				
⑧1号上屋新築工事(2工区)			2工区(18ヶ月)	後ろ倒し		2工区(18ヶ月)	
⑨陸送上屋・車路新築工事			20ヶ月				
⑩2号上屋新築工事				1工区・2工区(20ヶ月)			
⑪かにかご上屋改築工事			12ヶ月				
⑫6号上屋新築工事			12ヶ月	後ろ倒し		12ヶ月	
⑬4号上屋 3号上屋(北)改修工事						9ヶ月	

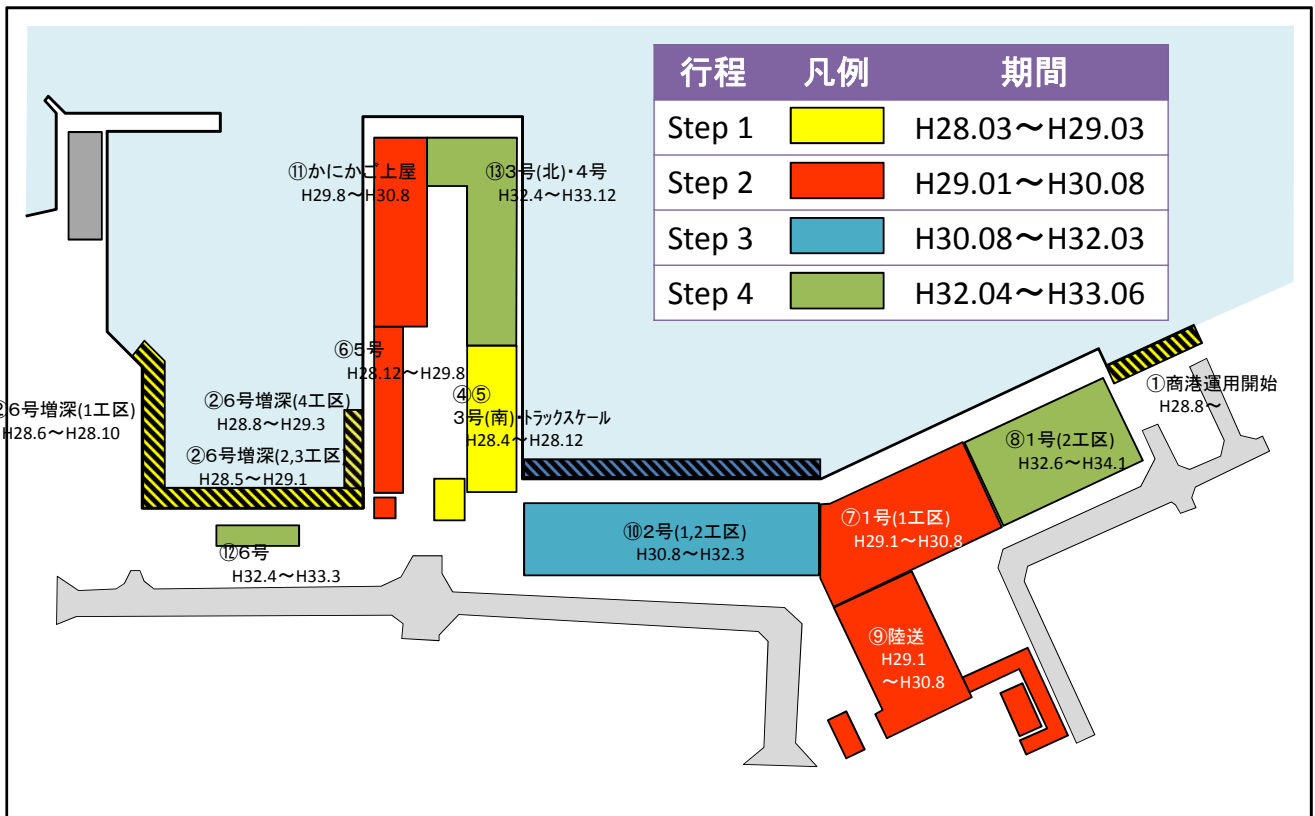

市場整備想定スケジュール(変更案)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
		Step 1	Step 2		Step 3	Step 4		
①港湾岸壁仮設工事		●8月～運用開始						
②5・6・7号増深工事		←浚渫工事→						
③2号岸壁耐震化工事								
④トラックスケール新築工事		9ヶ月 ●1月～トラックスケール切り替え						
⑤3号上屋(南)改築工事		9ヶ月						
⑥5号上屋改修工事			9ヶ月					
⑦1号上屋新築工事(1工区)			1工区(31ヶ月)					
⑧1号上屋新築工事(2工区)			2工区(31ヶ月)					
⑨陸送上屋・車路新築工事			21ヶ月					
⑩2号上屋新築工事					1工区・2工区(31ヶ月)			
⑪かにかご上屋改築工事			12ヶ月					
⑫6号上屋新築工事							6ヶ月 ※調整中	
⑬4号上屋 3号上屋(北)改修工事							7ヶ月 ※調整中	

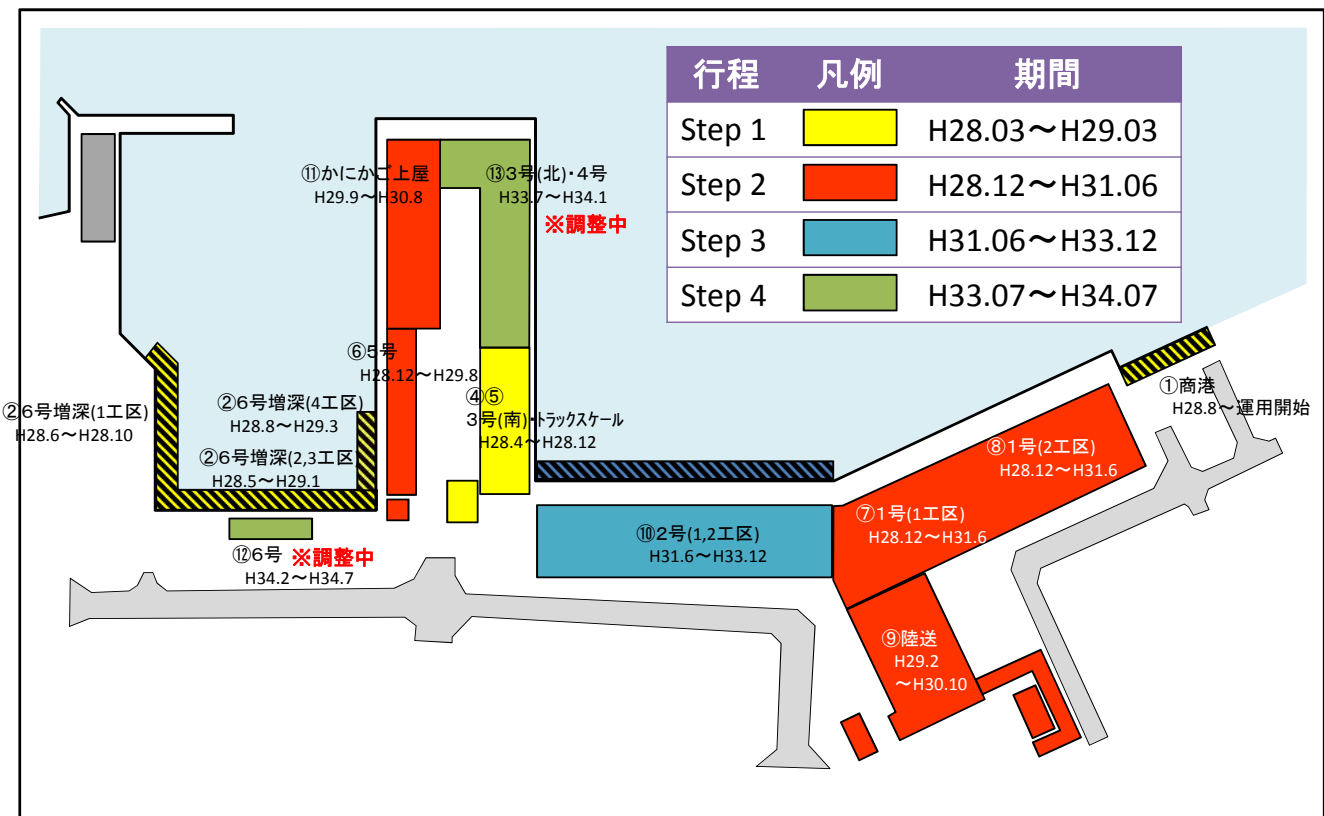


境港高度衛生管理型市場整備(平成28年度 工事スケジュール)

(平成28年10月26日現在)

項目	工期	平成27年度			平成28年度												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
① 港湾岸壁仮設工事	H28. 3~H28. 6			←													
② 7号岸壁増深工事	H28. 3~H28. 10			←													
③ 6号岸壁増深工事	H28. 4~H29. 1			←													
④ 5号岸壁増深工事	H28. 11~H29. 3																
⑤ トラックスケール新築工事	H28. 4~H29. 12			←													
⑥ 3号上屋(南)改築工事	H28. 4~H28. 12			←													
⑦ 5号上屋(南)改修工事	H28. 12~H29. 8																
⑧ 1号上屋新築工事	H28. 12~H31. 6																
⑨ 陸送上屋新築工事	H28. 11~H30. 10																

注) 現場作業に影響のある期間

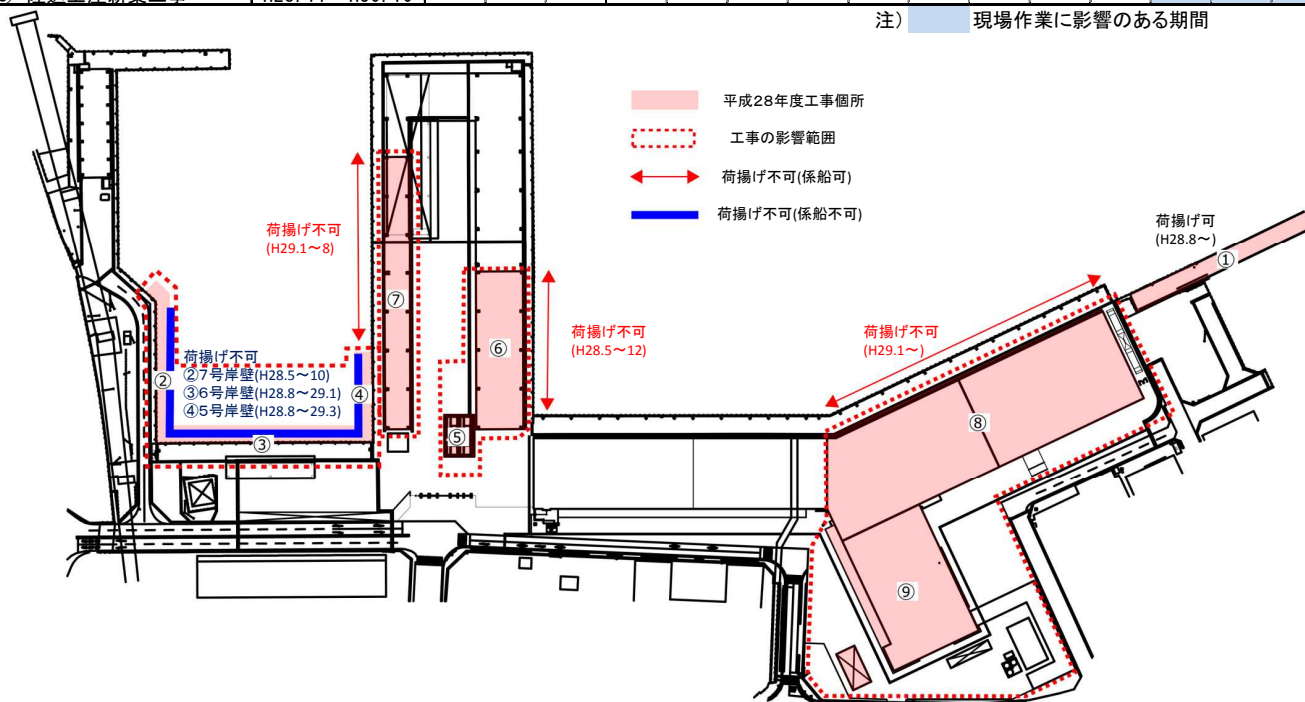

工事期間中の課題と課題に対する協力をお願い

○荷揚げスペースの確保

1号、5号、6号を工事 → 商港、2号~4号、7号岸壁に機能分散
各漁業種類で協力し、荷揚げ岸壁の円滑な利用が必要。

⇒適時の着岸 → 速やかな水揚げ、休憩岸壁への移動に協力を

○荷さばきスペースの確保

1号上屋工事中 → 2号上屋、3号仮設上屋に機能を分散
これまで1号で実施のセリ・入札⇔仲卸・仕立スペースとの調整が必要。

⇒今後、運用ルール等を関係者と協議・調整予定

○漁港区域内の契約駐車場について(平成29年1月以降)

- 第2、3駐車場(6号岸壁) → トラック待機場所(岸壁工事完成後)
- 第4駐車場(流通会館西側) → 卸のトラック駐車場
- 第6駐車場(トラックスケール東側) → 陸送上屋建設に伴い廃止

⇒市場関係者の駐車場は、
陸送・1号上屋の屋上駐車場の供用開始まで、
各社で調達をお願いします。
